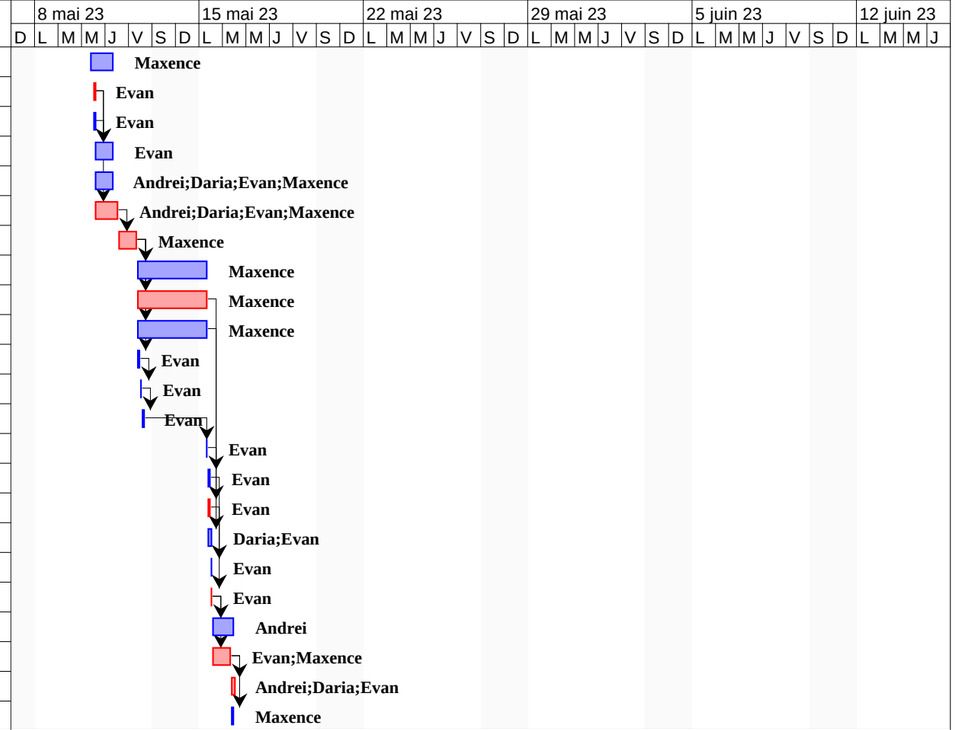		Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		Création du cahier des charges	1 jour	10/05/23 10:00	11/05/23 10:00		Maxence
2		Répartitions taches	0,125 jours	10/05/23 14:00	10/05/23 15:00		Evan
3		Estimations temps par taches	0,125 jours	10/05/23 14:00	10/05/23 15:00		Evan
4		Création diagramme de gantt	0,5 jours	10/05/23 15:00	11/05/23 10:00	2;3	Evan
5		Faire le cahier des test	0,375 jours	10/05/23 15:00	11/05/23 09:00		Andrei;Daria;Evan;Maxence
6		Test CRUD	1 jour	10/05/23 15:00	11/05/23 15:00	2	Andrei;Daria;Evan;Maxence
7		Création employé	0,5 jours	11/05/23 15:00	12/05/23 10:00	6	Maxence
8		Afficher les employé	1 jour	12/05/23 10:00	15/05/23 10:00	7	Maxence
9		Modifier les employer	1 jour	12/05/23 10:00	15/05/23 10:00	7	Maxence
10		Supprimer les employé	1 jour	12/05/23 10:00	15/05/23 10:00	7	Maxence
11		Test créer un compte	0,25 jours	12/05/23 10:00	12/05/23 13:00	7	Evan
12		Créer un compte	0,25 jours	12/05/23 13:00	12/05/23 15:00	11	Evan
13		Test créditer/débiter un compte	0,25 jours	12/05/23 15:00	12/05/23 17:00	12	Evan
14		Créditer/débiter un compte	0,25 jours	15/05/23 08:00	15/05/23 10:00	13	Evan
15		Test Effectuer un virement	0,25 jours	15/05/23 10:00	15/05/23 13:00	14	Evan
16		Test Clôturer	0,25 jours	15/05/23 10:00	15/05/23 13:00	9	Evan
17		Documentation doc Util	0,5 jours	15/05/23 10:00	15/05/23 15:00	10	Daria;Evan
18		Effectuer un virement	0,25 jours	15/05/23 13:00	15/05/23 15:00	15	Evan
19		Clôturer un compte	0,25 jours	15/05/23 13:00	15/05/23 15:00	16	Evan
20		Documentations des fonctionali...	0,75 jours	15/05/23 15:00	16/05/23 13:00	19	Andrei
21		Correction bug	0,5 jours	15/05/23 15:00	16/05/23 10:00	19	Evan;Maxence
22		Documentation doc technique	0,333 jours	16/05/23 10:00	16/05/23 13:40	21	Andrei;Daria;Evan
23		Créer et tester le jar	0,25 jours	16/05/23 10:00	16/05/23 13:00	21	Maxence
