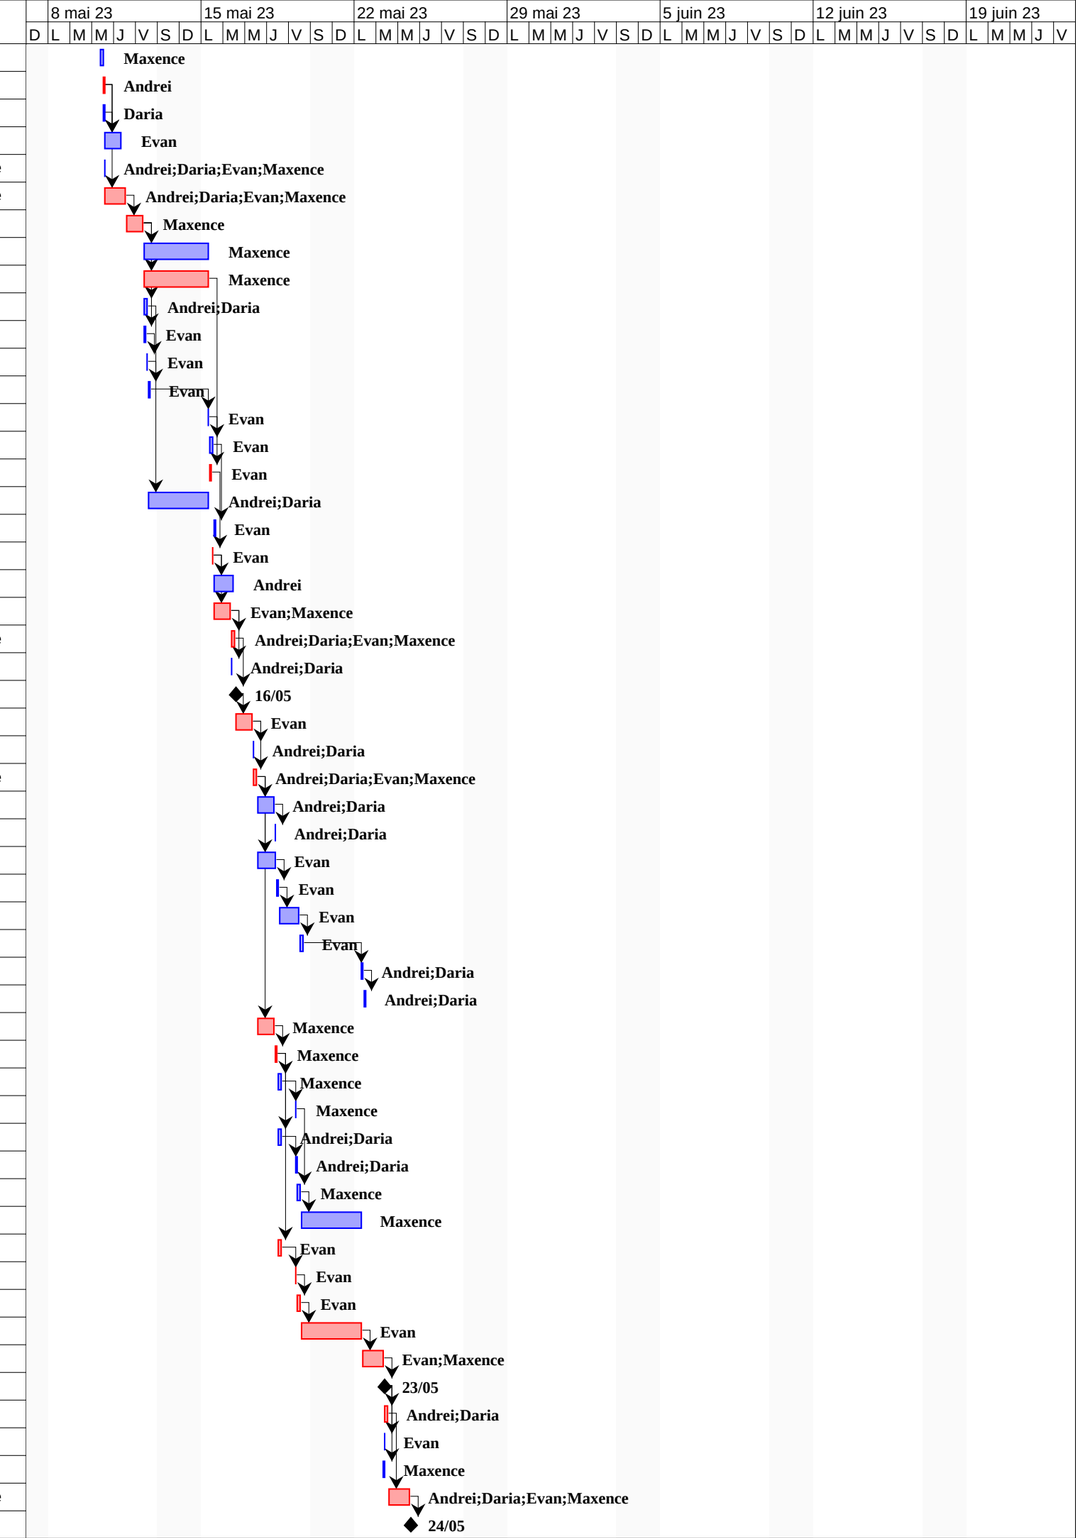		Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources
1		Création du cahier des charges	0,5 jours	10/05/23 10:00	10/05/23 15:00		Maxence
2		Répartitions taches	0,125 jours	10/05/23 14:00	10/05/23 15:00		Andrei
3		Estimations temps par taches	0,125 jours	10/05/23 14:00	10/05/23 15:00		Daria
4		Création diagramme de gantt	0,5 jours	10/05/23 15:00	11/05/23 10:00	2;3	Evan
5		Faire le cahier des test	0,125 jours	10/05/23 15:00	10/05/23 16:00		Andrei;Daria;Evan;Maxence
6		Test CRUD	1 jour	10/05/23 15:00	11/05/23 15:00	2	Andrei;Daria;Evan;Maxence
7		Création employé	0,5 jours	11/05/23 15:00	12/05/23 10:00	6	Maxence
8		Afficher les employé	1 jour	12/05/23 10:00	15/05/23 10:00	7	Maxence
9		Modifier les employer	1 jour	12/05/23 10:00	15/05/23 10:00	7	Maxence
10		Supprimer les employé	0,5 jours	12/05/23 10:00	12/05/23 15:00	7	Andrei;Daria
11		Test créer un compte	0,25 jours	12/05/23 10:00	12/05/23 13:00	7	Evan
12		Créer un compte	0,25 jours	12/05/23 13:00	12/05/23 15:00	11	Evan
13		Test créditer/débiter un compte	0,25 jours	12/05/23 15:00	12/05/23 17:00	12	Evan
14		Créditer/débiter un compte	0,25 jours	15/05/23 08:00	15/05/23 10:00	13	Evan
15		Test Effectuer un virement	0,5 jours	15/05/23 10:00	15/05/23 15:00	14	Evan
16		Test Clôturer	0,25 jours	15/05/23 10:00	15/05/23 13:00	9	Evan
17		Documentation doc Util	0,5 jours	12/05/23 15:00	15/05/23 10:00	10	Andrei;Daria
18		Effectuer un virement	0,25 jours	15/05/23 15:00	15/05/23 17:00	15	Evan
19		Clôturer un compte	0,25 jours	15/05/23 13:00	15/05/23 15:00	16	Evan
20		Documentations des fonctionali...	0,75 jours	15/05/23 15:00	16/05/23 13:00	19	Andrei
21		Correction bug	0,5 jours	15/05/23 15:00	16/05/23 10:00	19	Evan;Maxence
22		Documentation doc technique	0,5 jours	16/05/23 10:00	16/05/23 15:00	21	Andrei;Daria;Evan;Maxence
23		Créer et tester le jar	0,125 jours	16/05/23 10:00	16/05/23 11:00	21	Andrei;Daria
24		Recapitulatif de la V1	0 jours	16/05/23 15:00	16/05/23 15:00	22	
25		Création du gantt V2	0,375 jours	16/05/23 15:00	17/05/23 09:00	24	Evan
26		Chiffrage du projet	0,25 jours	17/05/23 09:00	17/05/23 11:00	25	Andrei;Daria
27		Cahier de test v2	0,5 jours	17/05/23 09:00	17/05/23 14:00	25	Andrei;Daria;Evan;Maxence
28		Créer débit exceptionnel	0,5 jours	17/05/23 14:00	18/05/23 09:00	27	Andrei;Daria
29		Test Débit exceptionnel	0,25 jours	18/05/23 09:00	18/05/23 11:00	28	Andrei;Daria
30		Simuler emprunt	0,75 jours	17/05/23 14:00	18/05/23 11:00	27	Evan
31		Test Simuler emprunt	0,375 jours	18/05/23 11:00	18/05/23 15:00	30	Evan
32		Simuler assurance	0,75 jours	18/05/23 15:00	19/05/23 13:00	31	Evan
33		Test Simuler assurance	0,5 jours	19/05/23 13:00	19/05/23 17:00	32	Evan
34		Relevé PDF	0,375 jours	22/05/23 08:00	22/05/23 11:00	33	Andrei;Daria
35		Test relevé PDF	0,25 jours	22/05/23 11:00	22/05/23 14:00	34	Andrei;Daria
36		Prélevement automatique	0,5 jours	17/05/23 14:00	18/05/23 09:00	27	Maxence
37		Test prélevement automatique	0,375 jours	18/05/23 09:00	18/05/23 13:00	36	Maxence
38		Recherche Prelevement autom...	0,5 jours	18/05/23 13:00	18/05/23 17:00	37	Maxence
39		Test Recherche Prelevement a...	0,25 jours	19/05/23 08:00	19/05/23 10:00	38	Maxence
40		Supprimer prélevement	0,5 jours	18/05/23 13:00	18/05/23 17:00	37	Andrei;Daria
41		Test supprimer prélevement au...	0,375 jours	19/05/23 08:00	19/05/23 11:00	40	Andrei;Daria
42		Modification prélevement	0,5 jours	19/05/23 10:00	19/05/23 15:00	39	Maxence
43		Test modification prélevement	0,375 jours	19/05/23 15:00	22/05/23 09:00	42	Maxence
44		Prélevement automatique	0,5 jours	18/05/23 13:00	18/05/23 17:00	37	Evan
45		Test Prélevement automatique	0,25 jours	19/05/23 08:00	19/05/23 10:00	44	Evan
46		Relevé mensuel	0,5 jours	19/05/23 10:00	19/05/23 15:00	45	Evan
47		Test relevé mensuel	0,375 jours	19/05/23 15:00	22/05/23 09:00	46	Evan
48		Correction bug	1 jour	22/05/23 09:00	23/05/23 09:00	47	Evan;Maxence
49		Code terminé	0 jours	23/05/23 09:00	23/05/23 09:00	48	
50		Doc utilisateur v2	0,5 jours	23/05/23 09:00	23/05/23 14:00	49	Andrei;Daria
51		Gantt v2 réaliser	0,25 jours	23/05/23 09:00	23/05/23 11:00	49	Evan
52		Exportation du Jar	0,125 jours	23/05/23 09:00	23/05/23 10:00	49	Maxence
53		Doc Technique V2	1 jour	23/05/23 14:00	24/05/23 14:00	50	Andrei;Daria;Evan;Maxence
54		Projet Finalisé	0 jours	24/05/23 14:00	24/05/23 14:00	53
